



Compte rendu des travaux de
couverture et d'isolation en RGE



Vous trouverez ci-dessous mon compte rendu de chantier

1/ Etat des lieux du toit avant travaux:



Nous pouvons apercevoir sur ces deux photos, l'état de la couverture avant travaux.

2/ Dépose de la couverture, nettoyage, mise en place de pare vapeur et calage d'avant toit:

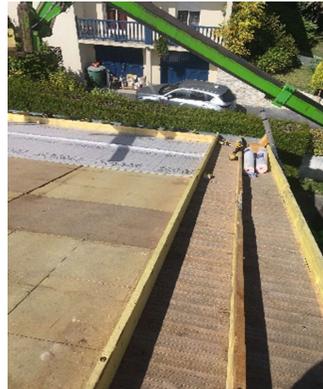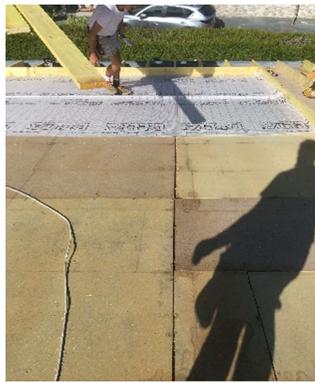


3/ Isolation



Nous pouvons observer la mise en place des panneaux d'isolation bien jointés, posés sur le pare vapeur et fixés à l'aide des contres lattes et de vis adaptées.

4/ Préparation à la couverture:

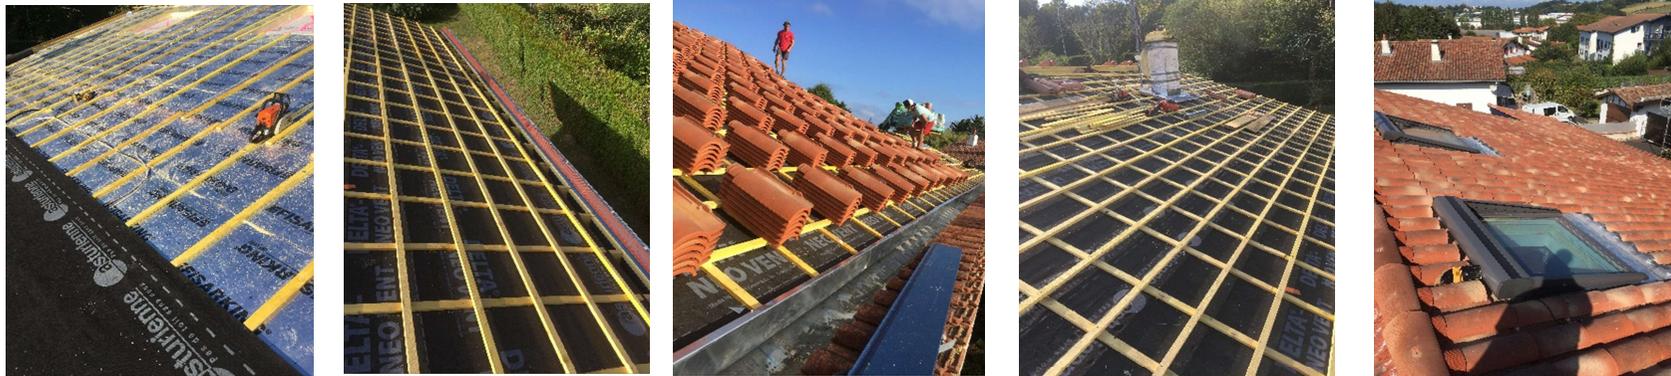

Mise en place du film sous toiture avec vide d'air, des liteaux pour la tuile, les Velux et de la zinguerie.

5/ Couverture



Nous pouvons voir la mise en place de la tuile à emboîtement, les tuiles à douilles et chatières ainsi que le faitage vissé comme les tuiles de rives.

Commentaires :

L'ensemble du toit a été repris à neuf hormis le chaineau en mitoyenneté qui était en bon état et l'enduit de la cheminée qui présente des fissures.



Nous pouvons voir sur les photos, tout le câblage électrique repris dans l'épaisseur de l'isolation sous la tuile
